



<b>Дата происшествия:</b>	14.06.2022
<b>№ происшествия:</b>	№ оCard-8175/2022
<b>Объект:</b>	КТК-Р. Морской терминал. ПУУМ.
<b>Процесс / Оборудование:</b>	Установка крана
<b>Местоположение:</b>	Береговые сооружения, технологическая эстакада

**ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :**

**Опасная ситуация (предпосылка к происшествию)**

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :**

**ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ :**

На территории МТ зона «А» в районе технологической эстакады, при выполнении подготовительных работах по наряд-допуску, во время установки крана ТАДАНО грузоподъемностью 80 т. (стрела находилась в транспортном положении) произошло смещение выносных опор (аутригеров) на расстояние около 30-40см. с подкладок. Машинистом крана предприняты меры по сборке аутригеров, после чего кран убран с площадки. Пострадавших нет, материального ущерба нет.

**Непосредственные причины:**


- Кран TADANO был установлен на площадке с углом наклона более 3 градусов, что превышает разрешенные паспортные характеристики крана.
- В нарушение утвержденного ППР и НД, с целью выравнивания площадки для установки крана, рабочей бригадой под передние выносные опоры были установлены подкладки, изготовленные из подручных материалов, а под заднюю правую опору было установлено несколько инвентарных башмаков.

**Коренные причины**

- Недостаточный контроль со стороны ОВР, место установки крана отличалось от схемы места производства работ, приложенной к наряд-допуску.
- Недостаточная оценка рисков ответственными лицами и исполнителями работ, потенциальные последствия выявленных опасностей недооценены

**ФОТО ФИКСАЦИЯ:**

Место установки крана и

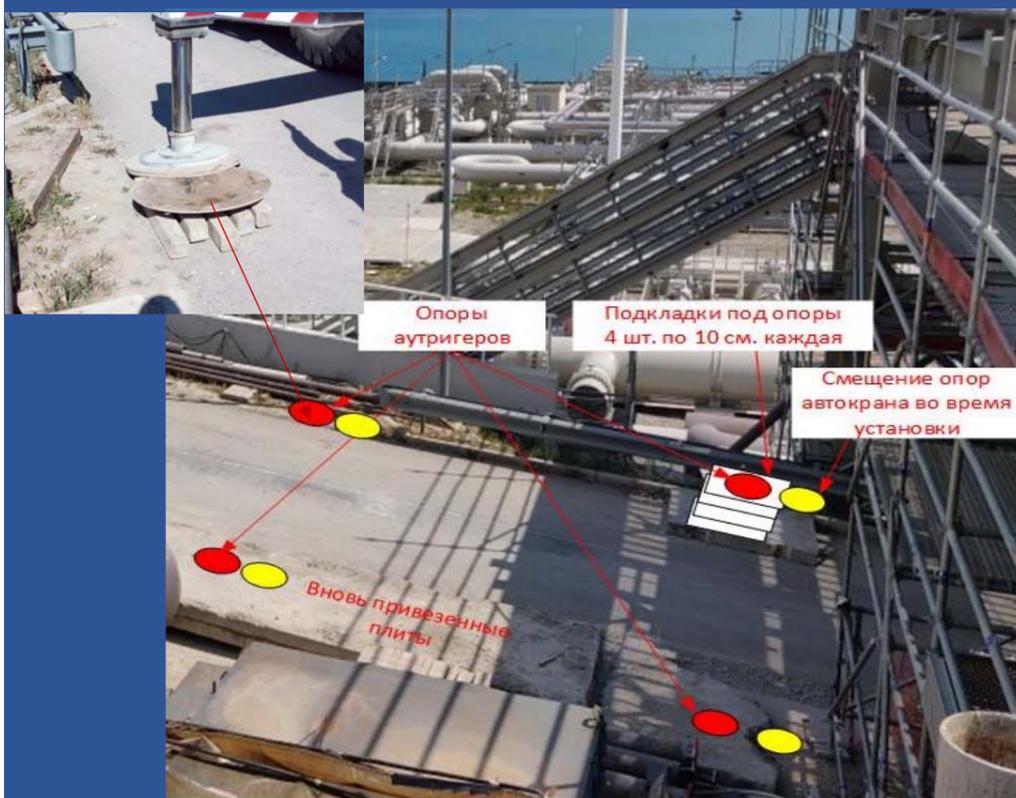

**ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ :**

- Обеспечить подготовку площадки для установки ПС с учетом категории и характера грунта. Уклон площадки должен соответствовать данным, указанным в паспорте и (или) в руководстве по эксплуатации ПС.
- Провести внеплановые инструктажи по теме «Производство грузоподъемных работ с применением подъемных сооружений» всем работникам подрядной и субподрядной организации.
- Запретить подкладывание под аутригеры подручных материалов (ламинированная фанера, разнотолщинный брус и прочие). Не допускать количество подкладок (башмаков) более 1шт. Инвентарные башмаки должны быть выполнены из однородных материалов (данное требование необходимо включить в НД).
- Своевременно оповещать о произошедших опасных ситуациях. Оставлять место производства неизменным.



**ПРАВИЛО №10: грузоподъемные работы**

При выполнении грузоподъемных работ соблюдайте требования плана производства работ, технологической карты, наряда-допуска

Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости.
